







































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25	28	2
1		启动	15 个工作日	2019年4月30日	2019年5月18日					
3		组建核心团	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日	2	liujinzhou, liuqi, xuchanglong			
4		干系人分析	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	3	liujinzhou			
5		里程碑计划	2 个工作日	2019年5月9日	2019年5月10日	4	liujinzhou			
6		制定项目章	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	5	liujinzhou			
7		制定项目发	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	6	liujinzhou			
9		规划	52 个工作日	2019年5月17日	2019年7月28日					
10		时间规划	13 个工作日	2019年6月6日	2019年6月22日					
11		排列工作	2 个工作日	2019年6月6日	2019年6月7日	22	liujinzhou			
12		估算资源	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	11	liujinzhou			
13		估算持续	2 个工作日	2019年6月12日	2019年6月13日	12	liujinzhou			
14		制定进度	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	13	liujinzhou			
15		形成进度	5 个工作日	2019年6月17日	2019年6月21日	14	liujinzhou			
16		范围规划	13 个工作日	2019年5月17日	2019年6月4日					
17		制定需求	2 个工作日	2019年5月20日	2019年5月21日	8	liuqi			
18		界面设计	2 个工作日	2019年5月22日	2019年5月23日	17	xuchanglong			
19		详细设计	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	17	dingzeren			
20		范围说明	2 个工作日	2019年5月27日	2019年5月28日	17	liujinzhou			
21		创建WBS	2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日	18, 19, 20	liujinzhou			
22		形成范围	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日	21	liujinzhou			
23		规划成本	5 个工作日	2019年6月24日	2019年6月28日					
24		项目成本	2 个工作日	2019年6月24日	2019年6月25日	22	liujinzhou			
25		项目预算	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	24	liujinzhou			
26		形成范围	1 个工作日	2019年6月28日	2019年6月28日	25	liujinzhou			
27		规划质量	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日					
28		指定测试	1 个工作日	2019年7月1日	2019年7月1日	22	lishengpeng			
29		制定测试	2 个工作日	2019年7月2日	2019年7月3日	28	lishengpeng			
30		规划人力资	4 个工作日	2019年7月4日	2019年7月9日					
31		制定人力	2 个工作日	2019年7月4日	2019年7月5日	12	liujinzhou			
32		制定人员	2 个工作日	2019年7月8日	2019年7月9日	31	liujinzhou			
33		规划沟通	1 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日					
34		制定沟通	1 个工作	2019年7月10日	2019年7月10日	32	liujinzhou			
35		规划采购	4 个工作日	2019年7月11日	2019年7月16日					

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25	28	2
36		自制外购	2 个工作日	2019年7月11日	2019年7月12日	12	liujinzhou			
37		制定采购	2 个工作日	2019年7月15日	2019年7月16日	36	liujinzhou			
38		规划风险	7 个工作日	2019年7月19日	2019年7月29日					
39		识别风险	1 个工作日	2019年7月19日	2019年7月19日	10, 23, 27, 30	liujinzhou			
40		风险分析	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	39	liujinzhou			
41		制定风险	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	40	liujinzhou			
42		规划整合	3 个工作日	2019年7月25日	2019年7月29日	41	liujinzhou			
43		执行与监控	35 个工作日	2019年7月30日	2019年9月15日					
44		组建项目团队	2 个工作日	2019年7月30日	2019年7月31日	9	liujinzhou, yangzixu, baich			
45		项目执行	18 个工作日	2019年8月1日	2019年8月25日					
46		用户模块	12 个工作日	2019年8月1日	2019年8月16日					
47		注册登	2 个工作日	2019年8月1日	2019年8月2日	44	lichunliang			
48		发布订	2 个工作日	2019年8月2日	2019年8月5日	47	maolinxin			
49		搜索订	2 个工作日	2019年8月6日	2019年8月7日	47	mao			
50		查看订	1 个工作日	2019年8月8日	2019年8月8日	49	lichunliang			
51		接受订	3 个工作日	2019年8月8日	2019年8月12日	47	maolinxin			
52		管理订	0 个工作日	2019年8月13日	2019年8月13日	51	mao			
53		聊天系	1 个工作日	2019年8月14日	2019年8月14日	51	lichunliang			
54		个人配	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	47	maolinxin			
55		管理员模	7 个工作日	2019年8月17日	2019年8月25日					
56		用户信	2 个工作日	2019年8月16日	2019年8月19日	47	lichunliang			
57		快递信	6 个工作日	2019年8月16日	2019年8月23日	48	mao			
58		项目监控	16 个工作日	2019年8月26日	2019年9月15日					
59		各项指标监	2 个工作日	2019年8月29日	2019年8月30日	44	yangzixu, liujinzhou			
60		监控评审	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	59	dingzeren, liujinzhou, liuqi			
61		变更监控	1 个工作日	2019年9月4日	2019年9月4日	60	dingzeren, liujinzhou, liuqi			
63		管理干系人	8 个工作日	2019年9月16日	2019年9月25日					
64		发布项目信息	1 个工作日	2019年9月17日	2019年9月17日	44	liujinzhou			
65		报告监控指标	2 个工作日	2019年9月19日	2019年9月20日	44	liujinzhou			
66		干系人沟通	1 个工作日	2019年9月24日	2019年9月24日	44	liujinzhou			
67		团队建设	9 个工作日	2019年9月27日	2019年10月9日					
68		培训	1 个工作日	2019年9月27日	2019年9月27日	44	xuchanglong, yangzixu, baich			
69		娱乐活动	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	44	xuchanglong, yangzixu, baich			

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25	28	2
70			沟通	1 个工作日	2019年10月2日	2019年10月2日	44	xuchanglong, yangzixu, baich			
71			采购	2 个工作日	2019年10月4日	2019年10月7日	44	liujinzhou			
72			项目验收	2 个工作日	2019年10月8日	2019年10月9日	45	xuchanglong, yangzixu, baich			
73			收尾	5 个工作日	2019年10月16日	2019年10月22日					
74			项目终验	2 个工作日	2019年10月10日	2019年10月11日	72	xuchanglong, yangzixu, baich			
75			结束采购	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	72	liujinzhou			
76			项目内部收月	2 个工作日	2019年10月21日	2019年10月22日	72	xuchanglong, yangzixu, baich			



项目：代跑侠WBS

日期：2019年6月18日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度
















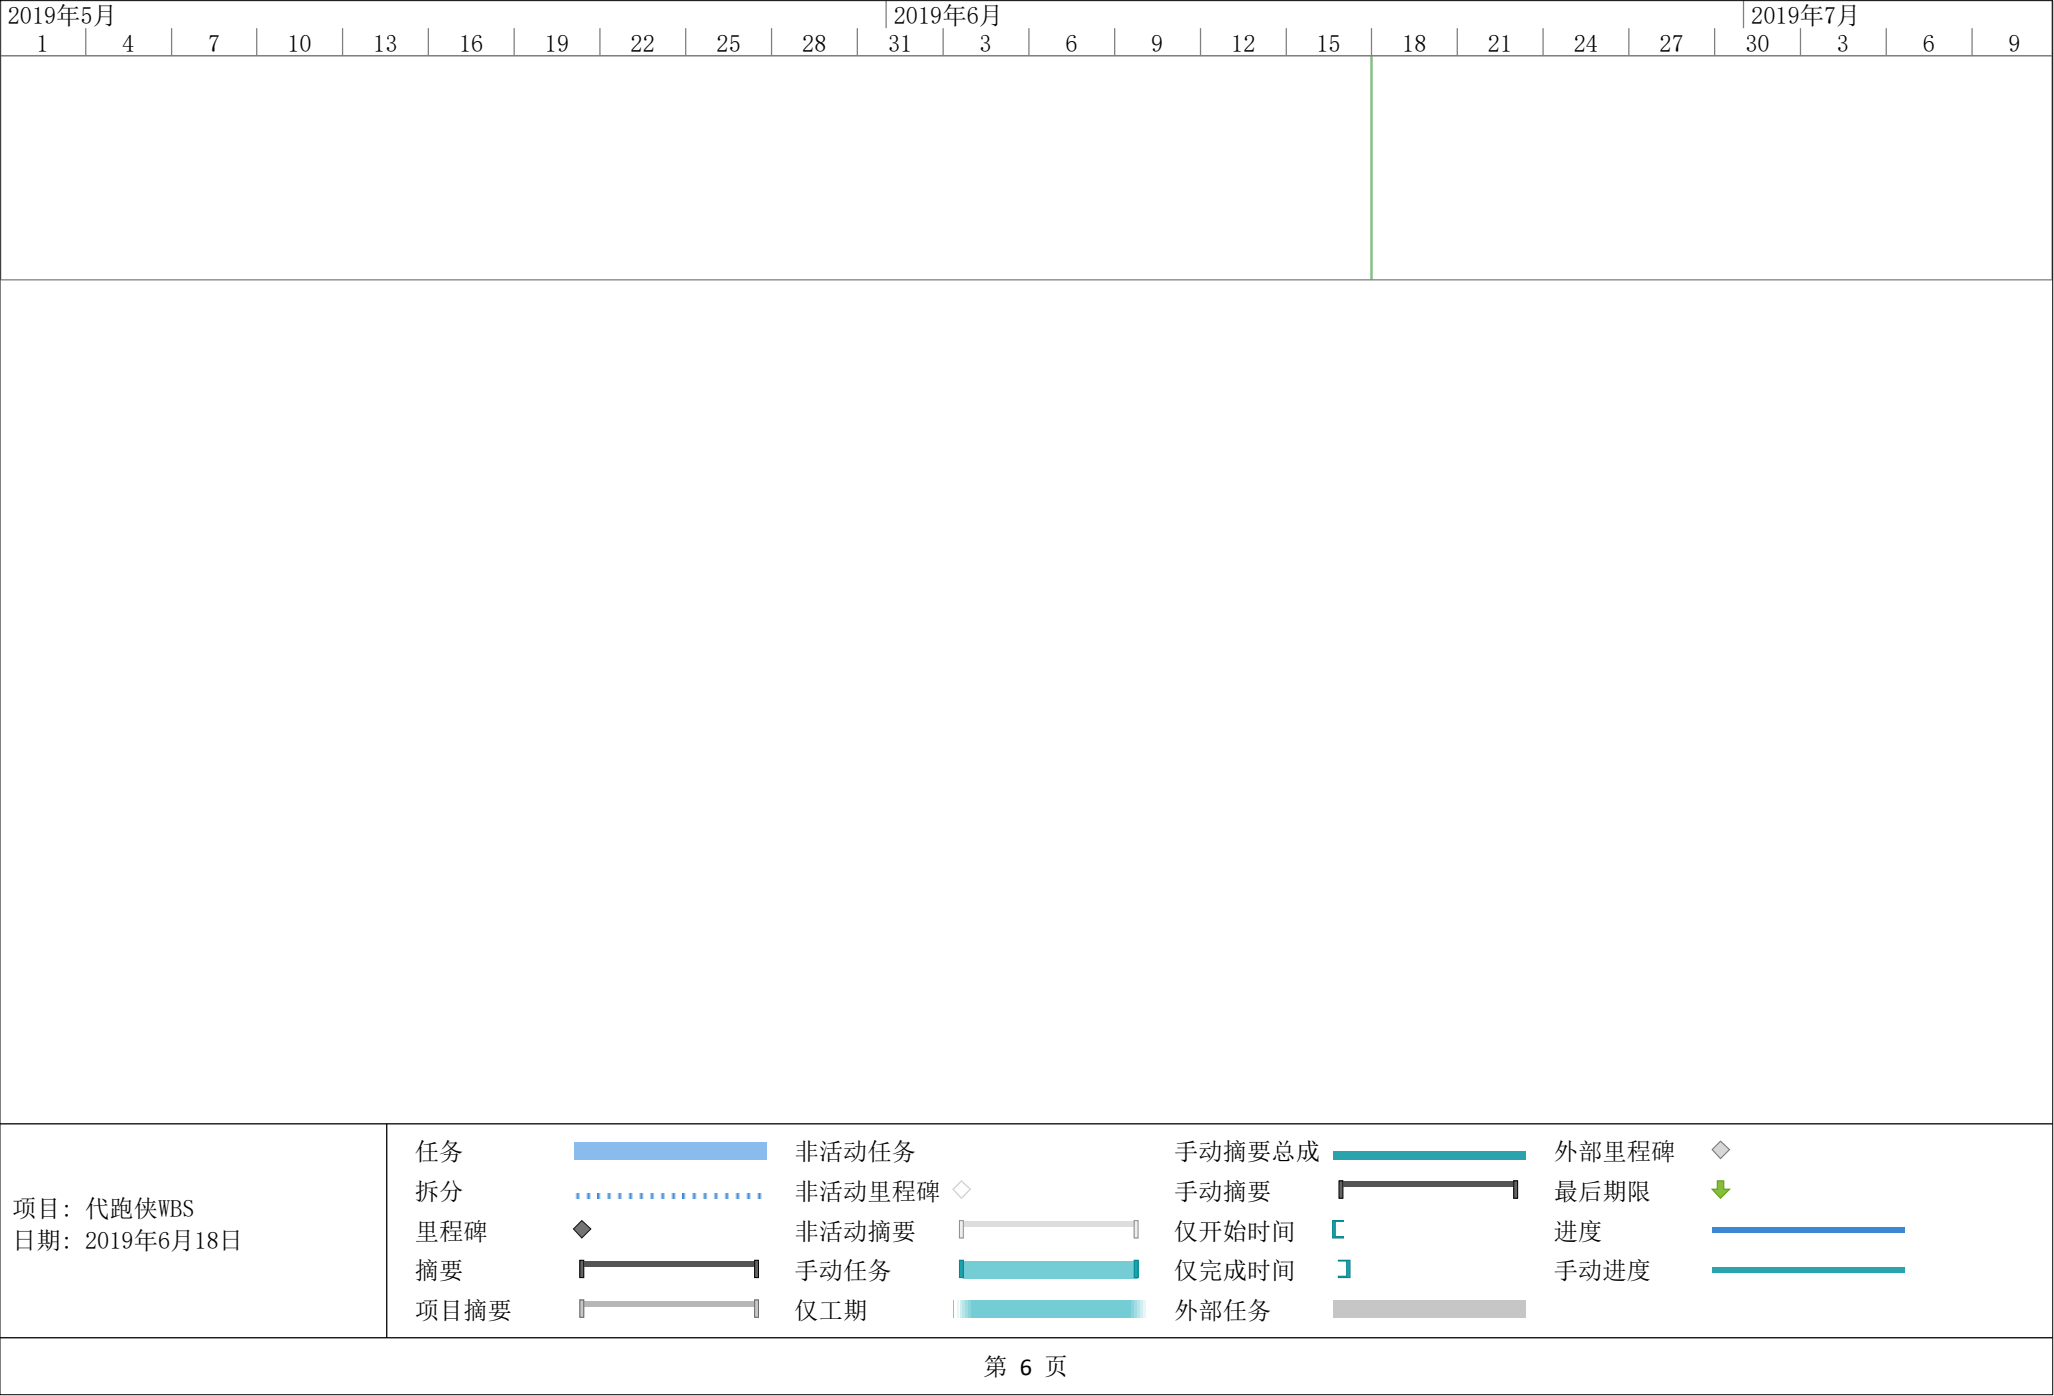

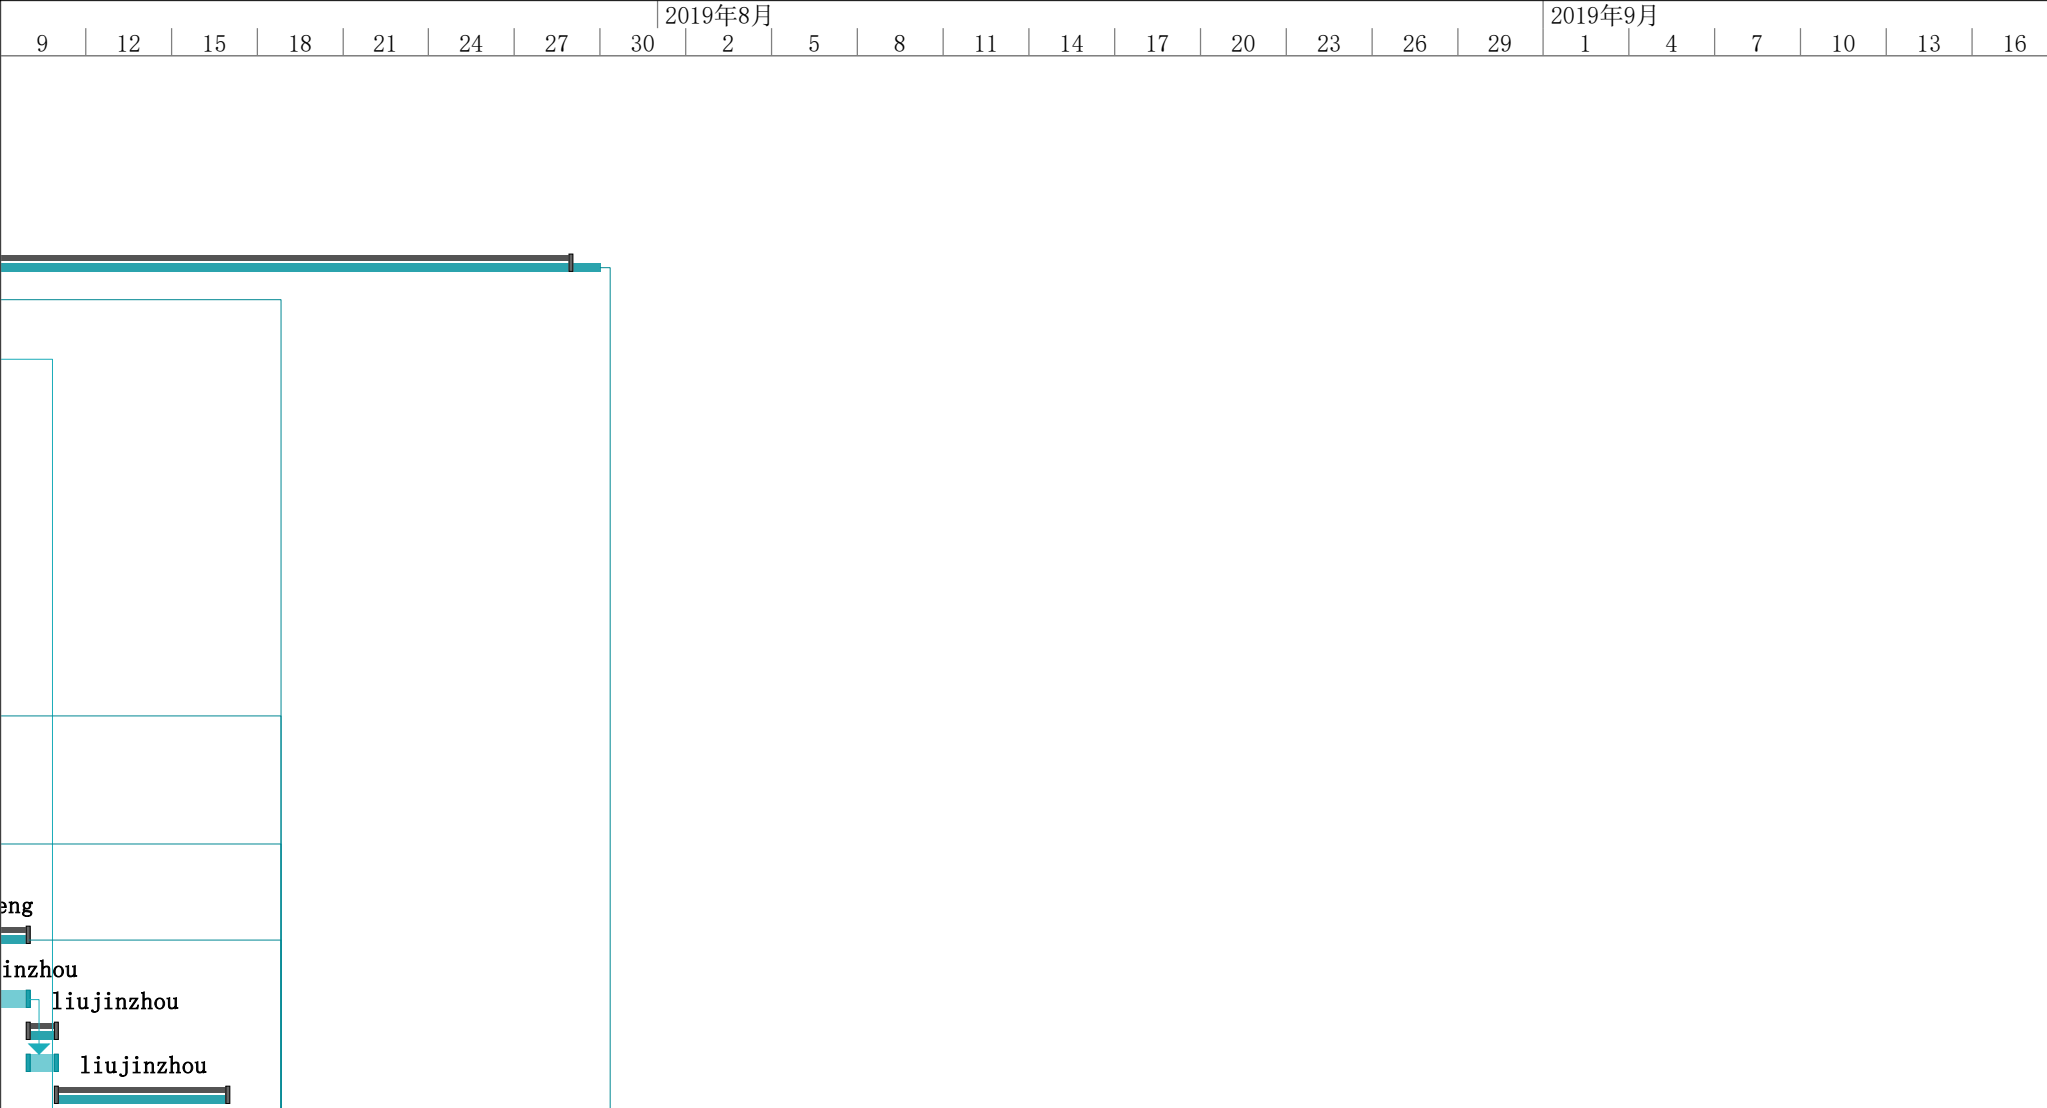














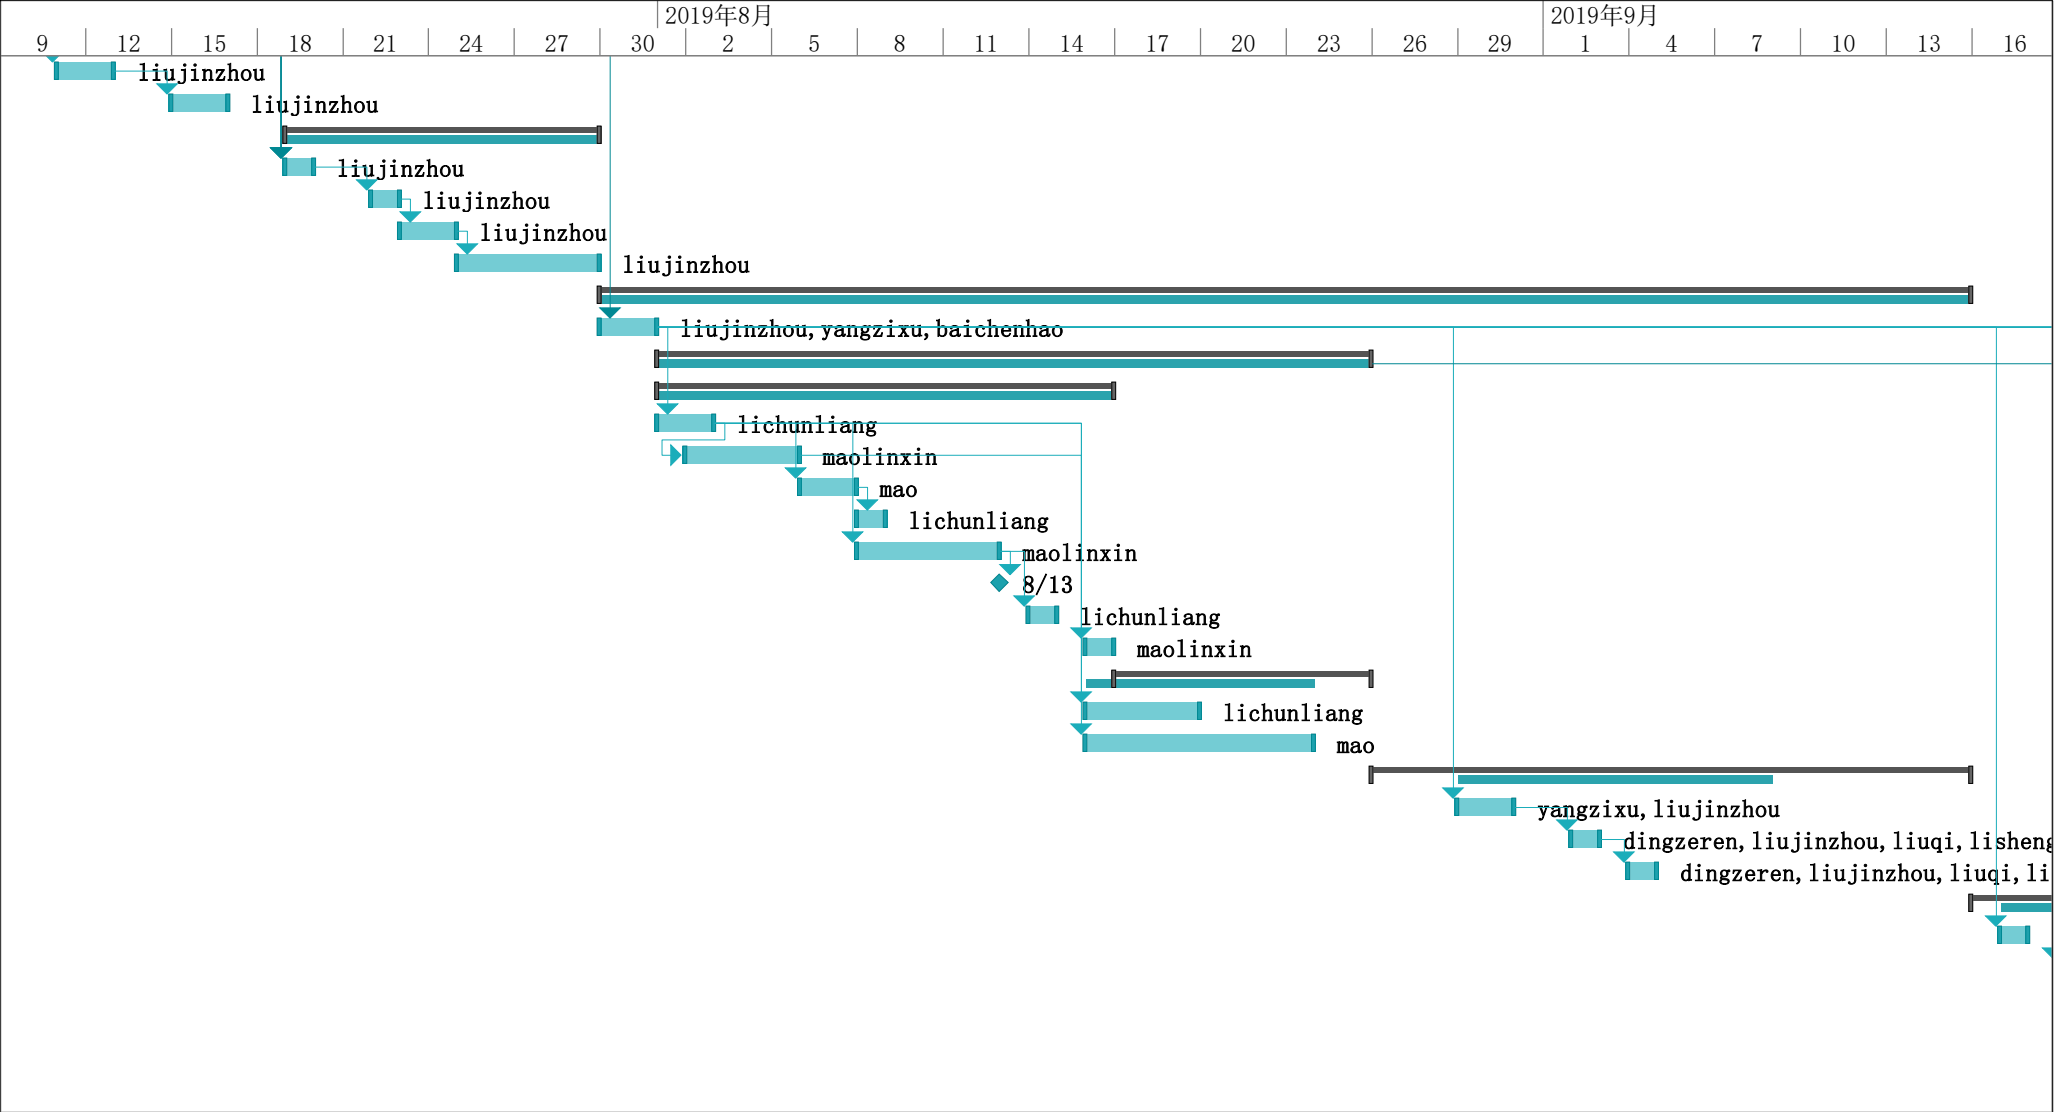






项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：代跑侠WBS 日期：2019年6月18日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			

