

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	25	28
1	启动	15 个工作日	2019年4月30日	2019年5月18日			¥8,050.00	¥8,050.00		
3	组建核心团	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日	2	liujinz	¥5,610.00	¥5,610.00		
4	干系人分析	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	3	liujinz	¥810.00	¥810.00		
5	里程碑计划	2 个工作日	2019年5月9日	2019年5月10日	4	liujinz	¥810.00	¥810.00		
6	制定项目章	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	5	liujinz	¥410.00	¥410.00		
7	制定项目发	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	6	liujinz	¥410.00	¥410.00		
9	规划	52 个工作日	2019年5月17日	2019年7月28日			¥19,000.00	¥19,000.00		
10	时间规划	13 个工作日	2019年6月6日	2019年6月22日			¥4,450.00	¥4,450.00		
11	排列工作	2 个工作日	2019年6月6日	2019年6月7日	22	liujinz	¥810.00	¥810.00		
12	估算资源	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	11	liujinz	¥410.00	¥410.00		
13	估算持续	2 个工作日	2019年6月12日	2019年6月13日	12	liujinz	¥810.00	¥810.00		
14	制定进度	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	13	liujinz	¥410.00	¥410.00		
15	形成进度	5 个工作日	2019年6月17日	2019年6月21日	14	liujinz	¥2,010.00	¥2,010.00		
16	范围规划	13 个工作日	2019年5月17日	2019年6月4日			¥4,830.00	¥4,830.00		
17	制定需求	2 个工作日	2019年5月20日	2019年5月21日	8	liuqi	¥800.00	¥800.00		
18	界面设计	2 个工作日	2019年5月22日	2019年5月23日	17	xuchang	¥800.00	¥800.00		
19	详细设计	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	17	dingzer	¥800.00	¥800.00		
20	范围说明	2 个工作日	2019年5月27日	2019年5月28日	17	liujinz	¥810.00	¥810.00		
21	创建WBS	2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日	18, 19, 20	liujinz	¥810.00	¥810.00		
22	形成范围	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日	21	liujinz	¥810.00	¥810.00		
23	规划成本	5 个工作日	2019年6月24日	2019年6月28日			¥2,030.00	¥2,030.00		
24	项目成本	2 个工作日	2019年6月24日	2019年6月25日	22	liujinz	¥810.00	¥810.00		
25	项目预算	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	24	liujinz	¥810.00	¥810.00		
26	形成范围	1 个工作日	2019年6月28日	2019年6月28日	25	liujinz	¥410.00	¥410.00		
27	规划质量	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日			¥1,200.00	¥1,200.00		
28	指定测试	1 个工作日	2019年7月1日	2019年7月1日	22	lisheng	¥400.00	¥400.00		
29	制定测试	2 个工作日	2019年7月2日	2019年7月3日	28	lisheng	¥800.00	¥800.00		
30	规划人力资	4 个工作日	2019年7月4日	2019年7月9日			¥1,620.00	¥1,620.00		
31	制定人力	2 个工作日	2019年7月4日	2019年7月5日	12	liujinz	¥810.00	¥810.00		
32	制定人员	2 个工作日	2019年7月8日	2019年7月9日	31	liujinz	¥810.00	¥810.00		
33	规划沟通	1 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日			¥410.00	¥410.00		
34	制定沟通	1 个工作	2019年7月10日	2019年7月10日	32	liujinz	¥410.00	¥410.00		
35	规划采购	4 个工作日	2019年7月11日	2019年7月16日			¥1,620.00	¥1,620.00		

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	25	28
36	自制外购	2 个工作日	2019年7月11日	2019年7月12日	12	liujinz	¥810.00	¥810.00		
37	制定采购	2 个工作日	2019年7月15日	2019年7月16日	36	liujinz	¥810.00	¥810.00		
38	规划风险	7 个工作日	2019年7月19日	2019年7月29日			¥2,840.00	¥2,840.00		
39	识别风险	1 个工作日	2019年7月19日	2019年7月19日	10, 23, 27, 30	liujinz	¥410.00	¥410.00		
40	风险分析	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	39	liujinz	¥410.00	¥410.00		
41	制定风险	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	40	liujinz	¥810.00	¥810.00		
42	规划整合	3 个工作日	2019年7月25日	2019年7月29日	41	liujinz	¥1,210.00	¥1,210.00		
43	执行与监控	35 个工作日	2019年7月30日	2019年9月15日			¥15,240.00	¥15,240.00		
44	组建项目团队	2 个工作日	2019年7月30日	2019年7月31日	9	liujinz	¥2,410.00	¥2,410.00		
45	项目执行	18 个工作日	2019年8月1日	2019年8月25日			¥8,000.00	¥8,000.00		
46	用户模块	12 个工作日	2019年8月1日	2019年8月16日			¥4,800.00	¥4,800.00		
47	注册登	2 个工作日	2019年8月1日	2019年8月2日	44	lichunl	¥800.00	¥800.00		
48	发布订	2 个工作日	2019年8月2日	2019年8月5日	47	maolinx	¥800.00	¥800.00		
49	搜索订	2 个工作日	2019年8月6日	2019年8月7日	47	mao	¥800.00	¥800.00		
50	查看订	1 个工作日	2019年8月8日	2019年8月8日	49	lichunl	¥400.00	¥400.00		
51	接受订	3 个工作日	2019年8月8日	2019年8月12日	47	maolinx	¥1,200.00	¥1,200.00		
52	管理订	0 个工作日	2019年8月13日	2019年8月13日	51	mao	¥0.00	¥0.00		
53	聊天系	1 个工作日	2019年8月14日	2019年8月14日	51	lichunl	¥400.00	¥400.00		
54	个人配	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	47	maolinx	¥400.00	¥400.00		
55	管理员模	7 个工作日	2019年8月17日	2019年8月25日			¥3,200.00	¥3,200.00		
56	用户信	2 个工作日	2019年8月16日	2019年8月19日	47	lichunl	¥800.00	¥800.00		
57	快递信	6 个工作日	2019年8月16日	2019年8月23日	48	mao	¥2,400.00	¥2,400.00		
58	项目监控	16 个工作日	2019年8月26日	2019年9月15日			¥4,830.00	¥4,830.00		
59	各项指标监	2 个工作日	2019年8月29日	2019年8月30日	44	yangzix	¥1,610.00	¥1,610.00		
60	监控评审	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	59	dingzer	¥1,610.00	¥1,610.00		
61	变更监控	1 个工作日	2019年9月4日	2019年9月4日	60	dingzer	¥1,610.00	¥1,610.00		
63	管理干系人	8 个工作日	2019年9月16日	2019年9月25日			¥1,630.00	¥1,630.00		
64	发布项目信息	1 个工作日	2019年9月17日	2019年9月17日	44	liujinz	¥410.00	¥410.00		
65	报告监控指标	2 个工作日	2019年9月19日	2019年9月20日	44	liujinz	¥810.00	¥810.00		
66	干系人沟通	1 个工作日	2019年9月24日	2019年9月24日	44	liujinz	¥410.00	¥410.00		
67	团队建设	9 个工作日	2019年9月27日	2019年10月9日			¥14,850.00	¥14,850.00		
68	培训	1 个工作日	2019年9月27日	2019年9月27日	44	xuchang	¥2,810.00	¥2,810.00		
69	娱乐活动	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	44	xuchang	¥2,810.00	¥2,810.00		

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	25	28
70	沟通	1 个工作日	2019年10月2日	2019年10月2日	44	xuchang	¥2,810.00	¥2,810.00		
71	采购	2 个工作日	2019年10月4日	2019年10月7日	44	liujinz	¥810.00	¥810.00		
72	项目验收	2 个工作日	2019年10月8日	2019年10月9日	45	xuchang	¥5,610.00	¥5,610.00		
73	收尾	5 个工作日	2019年10月16日	2019年10月22日			¥11,630.00	¥11,630.00		
74	项目终验	2 个工作日	2019年10月10日	2019年10月11日	72	xuchang	¥5,610.00	¥5,610.00		
75	结束采购	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	72	liujinz	¥410.00	¥410.00		
76	项目内部收尾	2 个工作日	2019年10月21日	2019年10月22日	72	xuchang	¥5,610.00	¥5,610.00		



项目：代跑侠WBS

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑







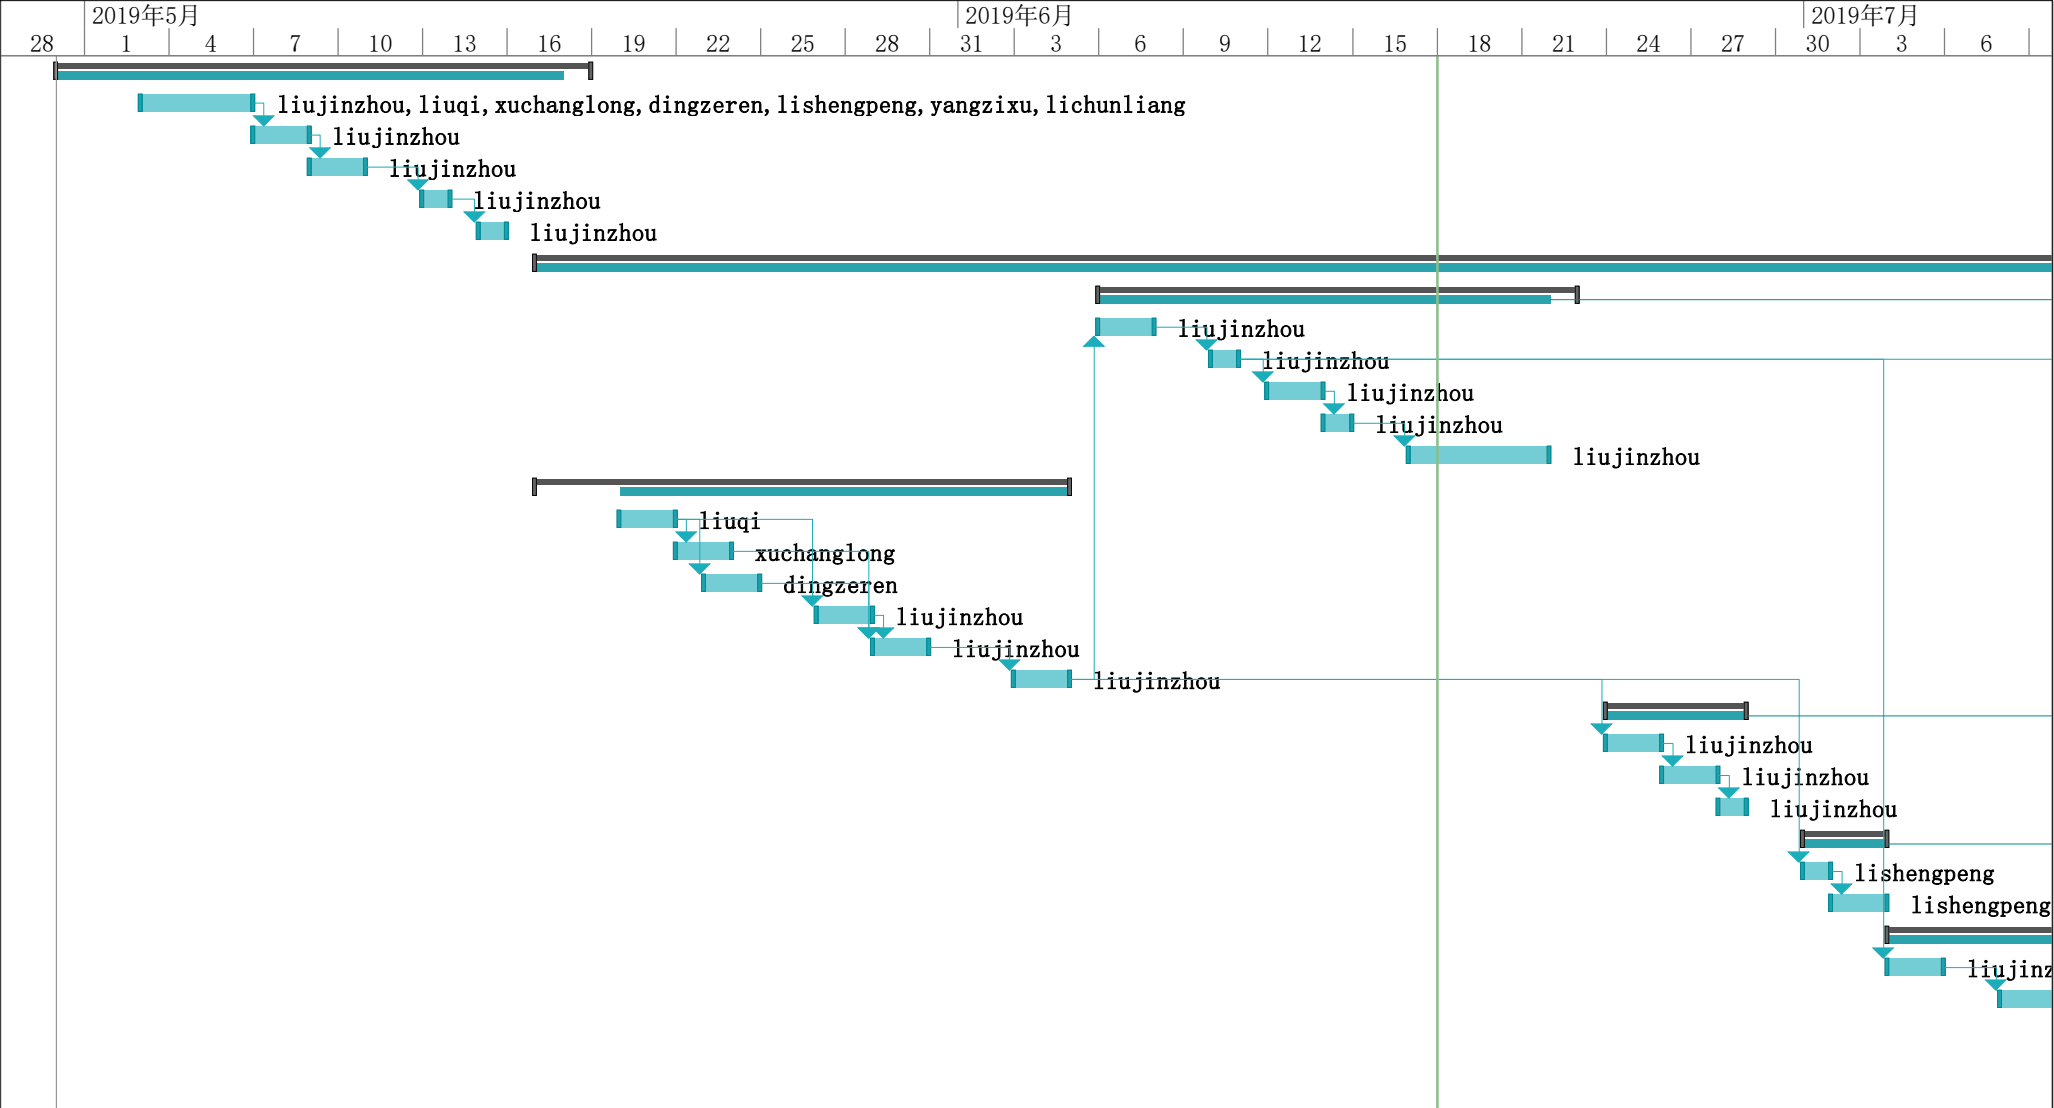












最后期限


进度









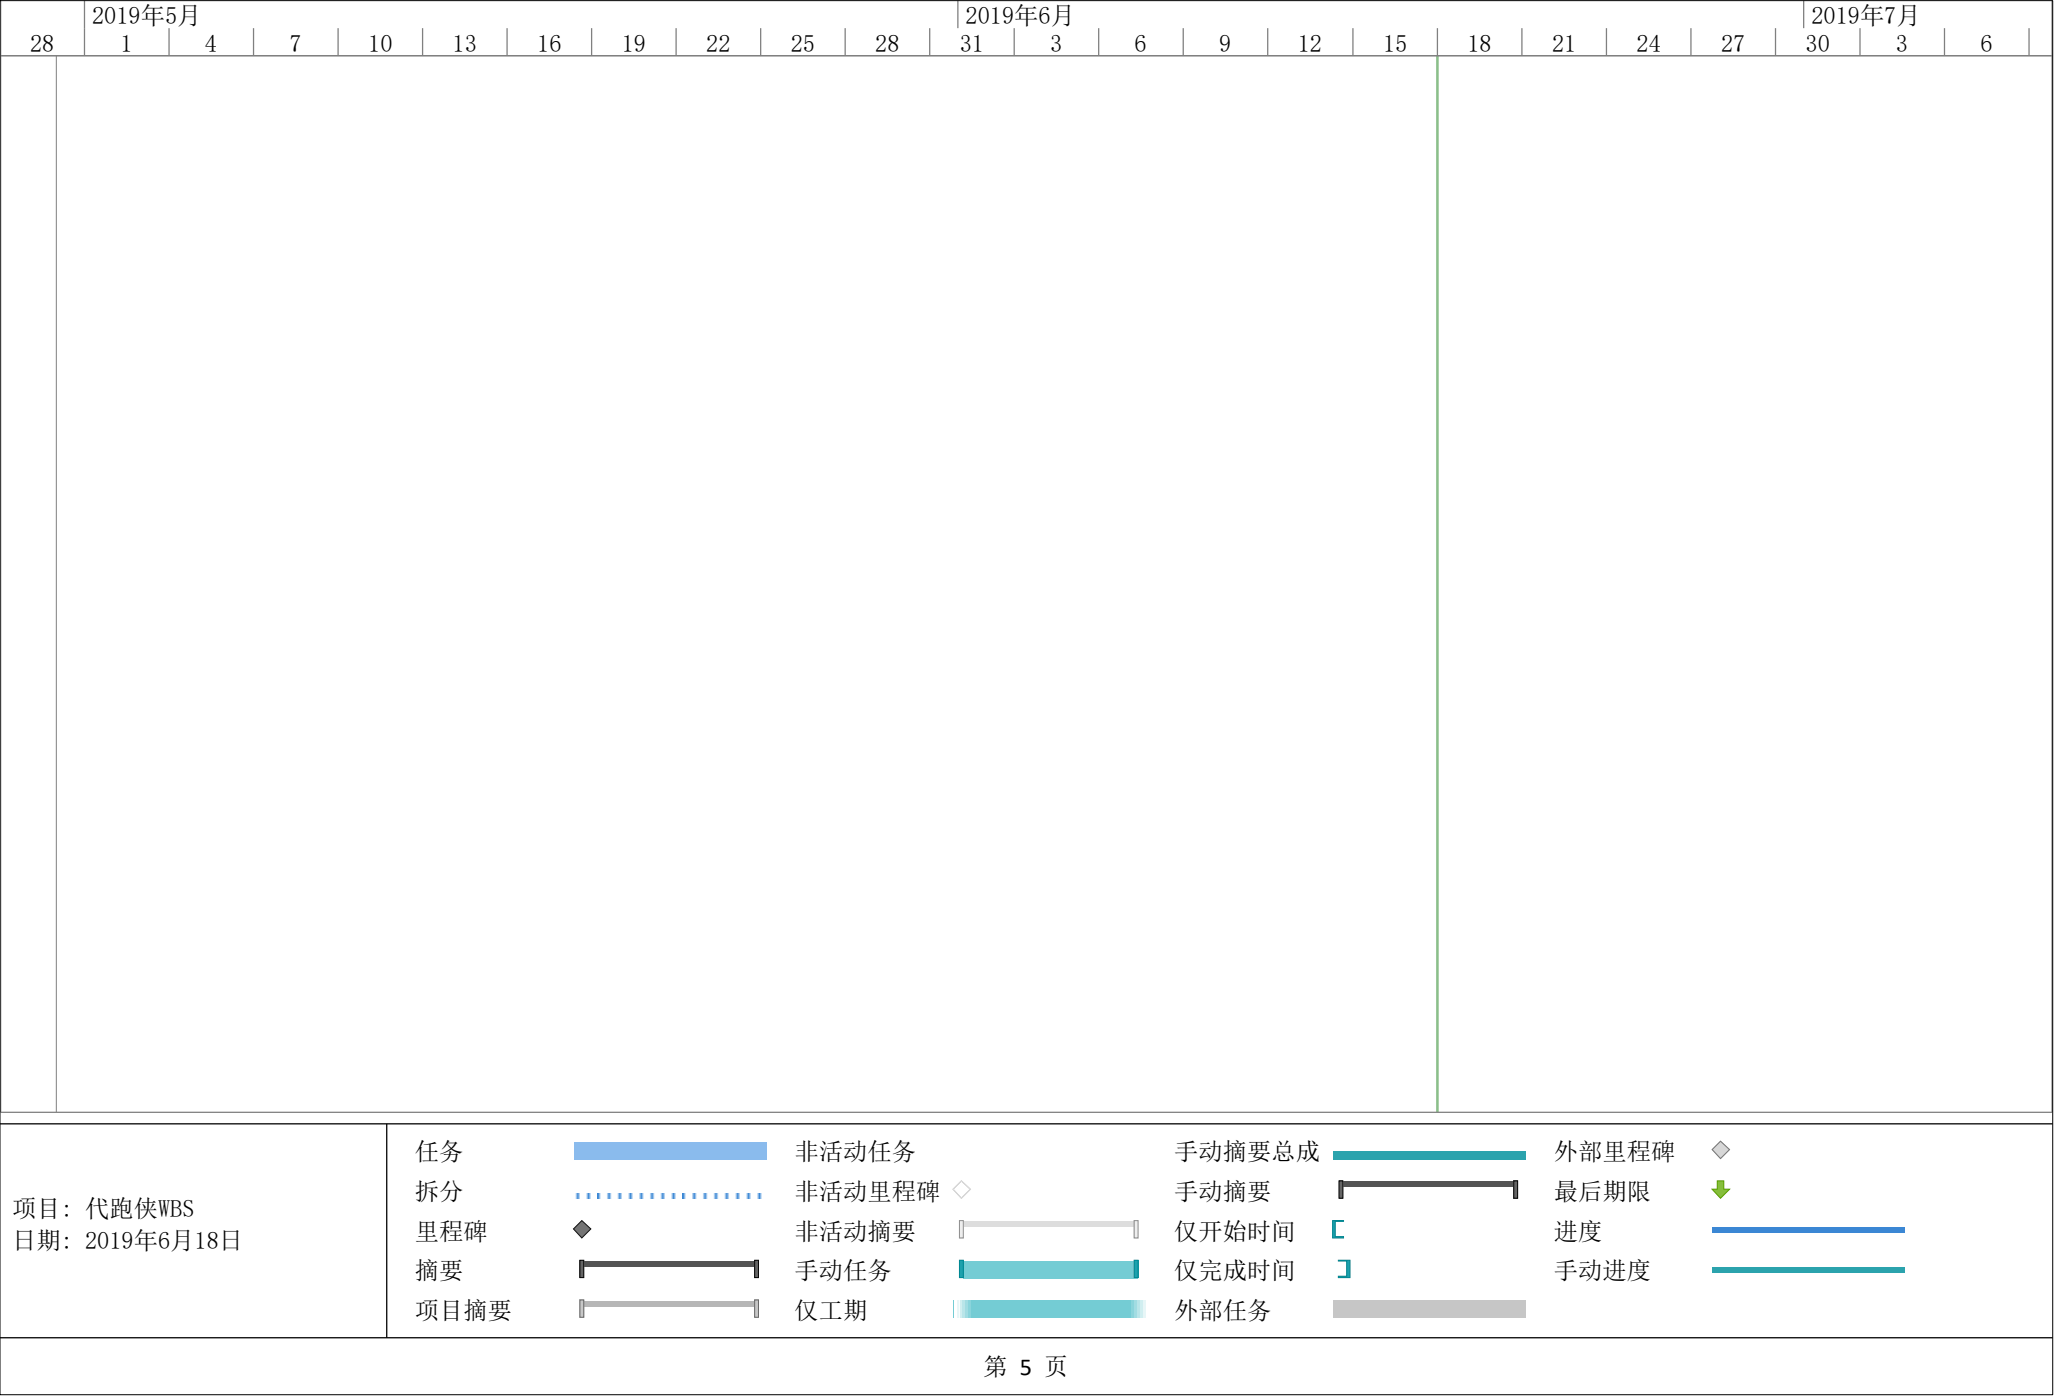









手动进度




项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			



		2019年5月										2019年6月							2019年7月						
28		1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	
项目：代跑侠WBS 日期：2019年6月18日					任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑														
					拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限														
					里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度														
					摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度														
					项目摘要		仅工期		外部任务																
第 6 页																									

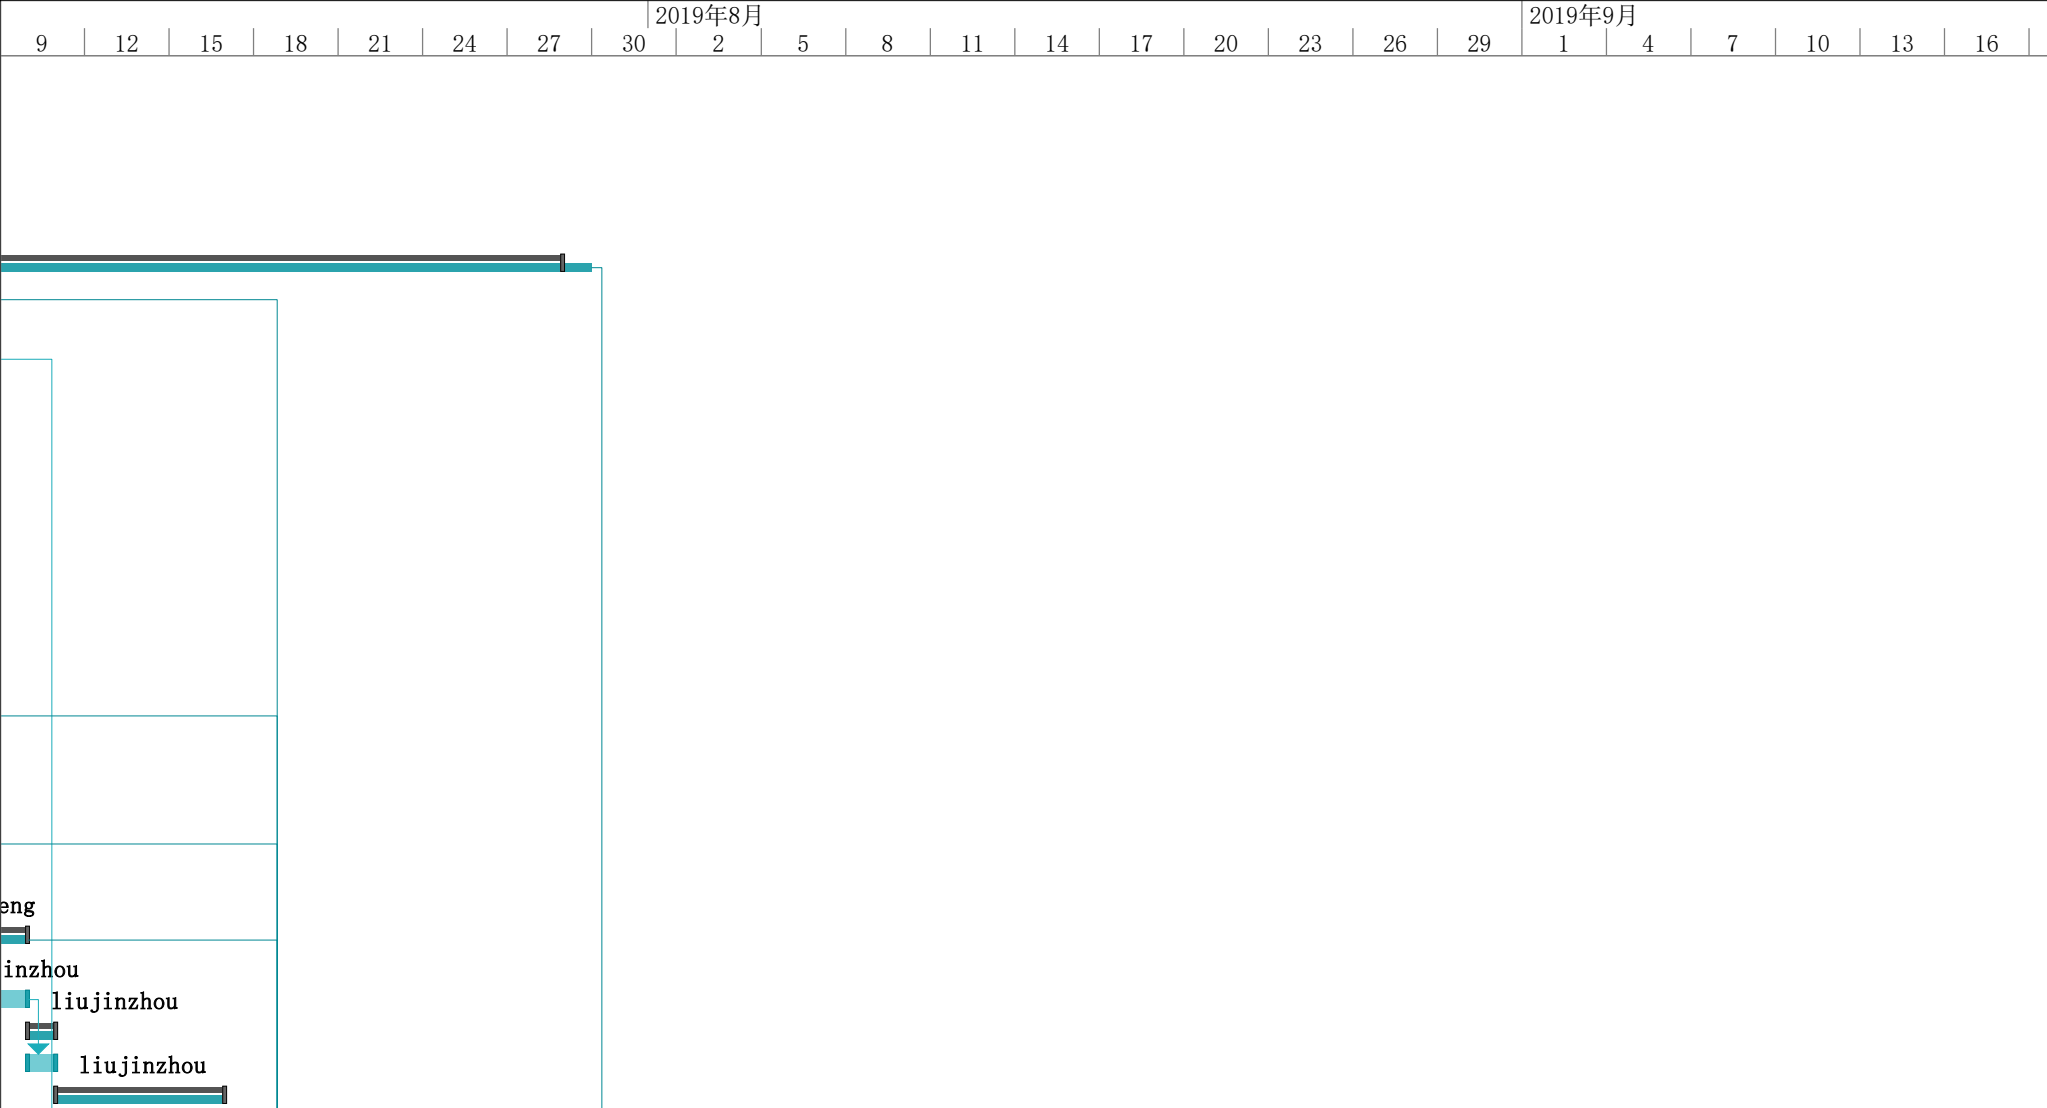

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要
项目摘要

.....

◆

非活动任务

非活动里程碑 ◇

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时

外部任务

C

3


11/11/2016

外部里程碑







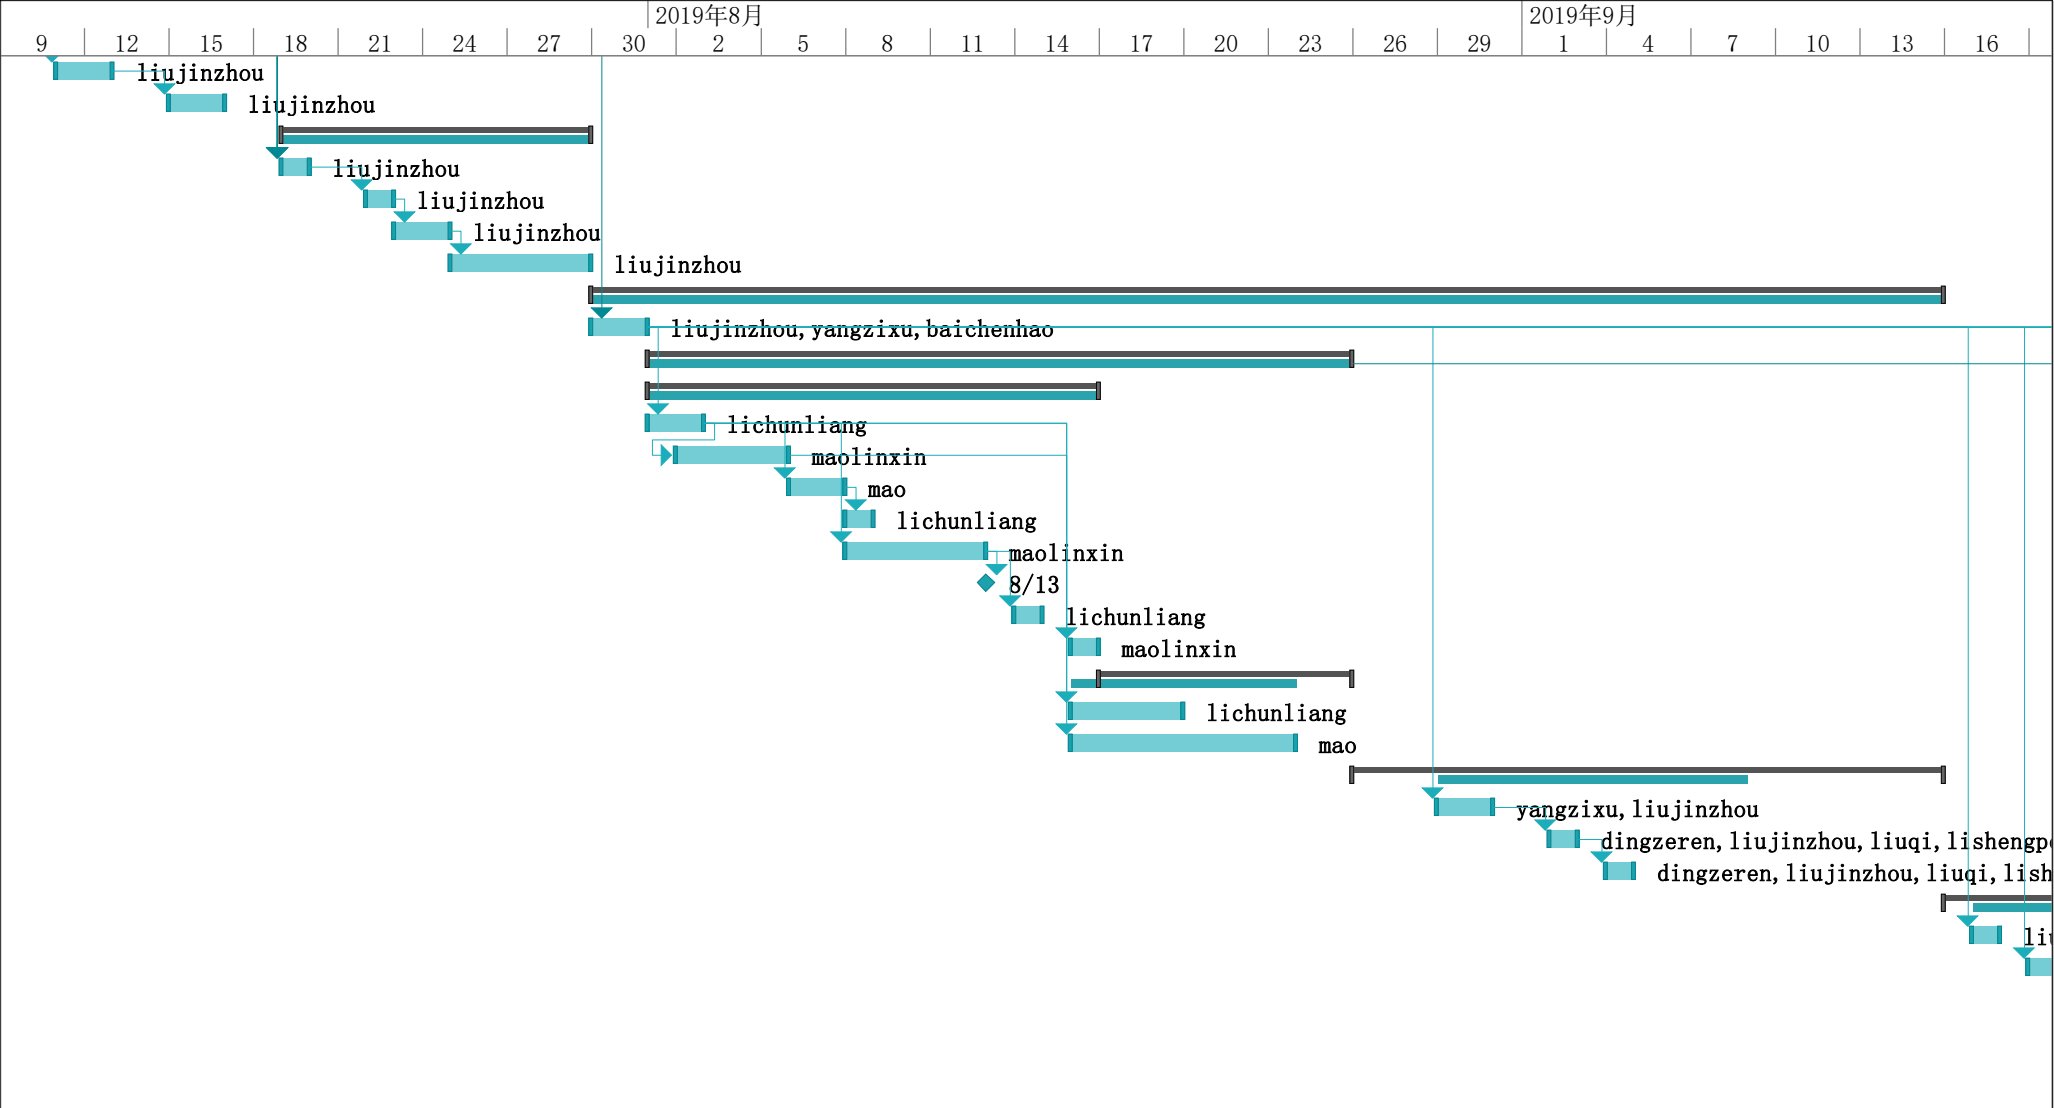








最后期限

进度

手动进度



项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	
