








































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	25	28	2019年5月				
									1	4	7	10	13
1		启动	15 个工作日	2019年4月30日	2019年5月18日								
2		任命项目经	3 个工作日	2019年4月30日	2019年5月2日								
3		组建核心团	2 个工作日	2019年5月3日	2019年5月6日	2							
4		干系人分析	2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	3							
5		里程碑计划	2 个工作日	2019年5月9日	2019年5月10日	4							
6		制定项目章	1 个工作日	2019年5月13日	2019年5月13日	5							
7		制定项目发	1 个工作日	2019年5月15日	2019年5月15日	6							
8		项目启动大	1 个工作日	2019年5月17日	2019年5月17日	7							
9		规划	52 个工作日	2019年5月17日	2019年7月28日								
10		时间规划	13 个工作日	2019年6月6日	2019年6月22日								
11		排列工作	2 个工作日	2019年6月6日	2019年6月7日	22							
12		估算资源	1 个工作日	2019年6月10日	2019年6月10日	11							
13		估算持续	2 个工作日	2019年6月12日	2019年6月13日	12							
14		制定进度	1 个工作日	2019年6月14日	2019年6月14日	13							
15		形成进度	5 个工作日	2019年6月17日	2019年6月21日	14							
16		范围规划	13 个工作日	2019年5月17日	2019年6月4日								
17		制定需求	2 个工作日	2019年5月20日	2019年5月21日	8							
18		界面设计	2 个工作日	2019年5月22日	2019年5月23日	17							
19		详细设计	2 个工作日	2019年5月23日	2019年5月24日	17							
20		范围说明	2 个工作日	2019年5月27日	2019年5月28日	17							
21		创建WBS	2 个工作日	2019年5月29日	2019年5月30日	18, 19, 20							
22		形成范围	2 个工作日	2019年6月3日	2019年6月4日	21							
23		规划成本	5 个工作日	2019年6月24日	2019年6月28日								
24		项目成本	2 个工作日	2019年6月24日	2019年6月25日	22							
25		项目预算	2 个工作日	2019年6月26日	2019年6月27日	24							
26		形成范围	1 个工作日	2019年6月28日	2019年6月28日	25							
27		规划质量	3 个工作日	2019年7月1日	2019年7月3日								
28		指定测试	1 个工作日	2019年7月1日	2019年7月1日	22							
29		制定测试	2 个工作日	2019年7月2日	2019年7月3日	28							
30		规划人力资	4 个工作日	2019年7月4日	2019年7月9日								
31		制定人力	2 个工作日	2019年7月4日	2019年7月5日	12							
32		制定人员	2 个工作日	2019年7月8日	2019年7月9日	31							
33		规划沟通	1 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日								

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	25	28	2019年5月				
	i								1	4	7	10	13
34		制定沟通	1 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日	32							
35		规划采购	4 个工作日	2019年7月11日	2019年7月16日								
36		自制外购	2 个工作日	2019年7月11日	2019年7月12日	12							
37		制定采购	2 个工作日	2019年7月15日	2019年7月16日	36							
38		规划风险	7 个工作日	2019年7月19日	2019年7月29日								
39		识别风险	1 个工作日	2019年7月19日	2019年7月19日	10, 23, 27, 30							
40		风险分析	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	39							
41		制定风险	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	40							
42		规划整合	3 个工作日	2019年7月25日	2019年7月29日	41							
43		执行与监控	35 个工作日	2019年7月30日	2019年9月15日								
44		组建项目团队	2 个工作日	2019年7月30日	2019年7月31日	9							
45		项目执行	18 个工作日	2019年8月1日	2019年8月25日								
46		用户模块	12 个工作日	2019年8月1日	2019年8月16日								
47		注册登	2 个工作日	2019年8月1日	2019年8月2日	44							
48		发布订	2 个工作日	2019年8月2日	2019年8月5日	47							
49		搜索订	2 个工作日	2019年8月6日	2019年8月7日	47							
50		查看订	1 个工作日	2019年8月8日	2019年8月8日	49							
51		接受订	3 个工作日	2019年8月8日	2019年8月12日	47							
52		管理订	0 个工作日	2019年8月13日	2019年8月13日	51							
53		聊天系	1 个工作日	2019年8月14日	2019年8月14日	51							
54		个人配	1 个工作日	2019年8月16日	2019年8月16日	47							
55		管理员模	7 个工作日	2019年8月17日	2019年8月25日								
56		用户信	2 个工作日	2019年8月16日	2019年8月19日	47							
57		快递信	6 个工作日	2019年8月16日	2019年8月23日	48							
58		项目监控	16 个工作日	2019年8月26日	2019年9月15日								
59		各项指标监	2 个工作日	2019年8月29日	2019年8月30日	44							
60		监控评审	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	59							
61		变更监控	1 个工作日	2019年9月4日	2019年9月4日	60							
62		例会	2 个工作日	2019年9月6日	2019年9月8日	44							
63		管理干系人	8 个工作日	2019年9月16日	2019年9月25日								
64		发布项目信息	1 个工作日	2019年9月17日	2019年9月17日	44							
65		报告监控看板	2 个工作日	2019年9月19日	2019年9月20日	44							
66		干系人沟通	1 个工作日	2019年9月24日	2019年9月24日	44							

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	25	28	2019年5月	1	4	7	10	1
67			团队建设	9 个工作日	2019年9月27日	2019年10月9日		25	28	2019年5月	1	4	7	10	1
68			培训	1 个工作日	2019年9月27日	2019年9月27日	44								
69			娱乐活动	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	44								
70			沟通	1 个工作日	2019年10月2日	2019年10月2日	44								
71			采购	2 个工作日	2019年10月4日	2019年10月7日	44								
72			项目验收	2 个工作日	2019年10月8日	2019年10月9日	45								
73			收尾	5 个工作日	2019年10月16日	2019年10月22日									
74			项目终验	2 个工作日	2019年10月10日	2019年10月11日	72								
75			结束采购	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	72								
76			项目内部收尾	2 个工作日	2019年10月21日	2019年10月22日	72								



项目：代跑侠WBS

日期：2019年6月18日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要
















非活动任务


非活动里程碑 


非活动摘要 


手动任务 


仅工期 


手动摘要总成 


手动摘要 


仅开始时间 


仅完成时间 


外部任务 

外部里程碑 







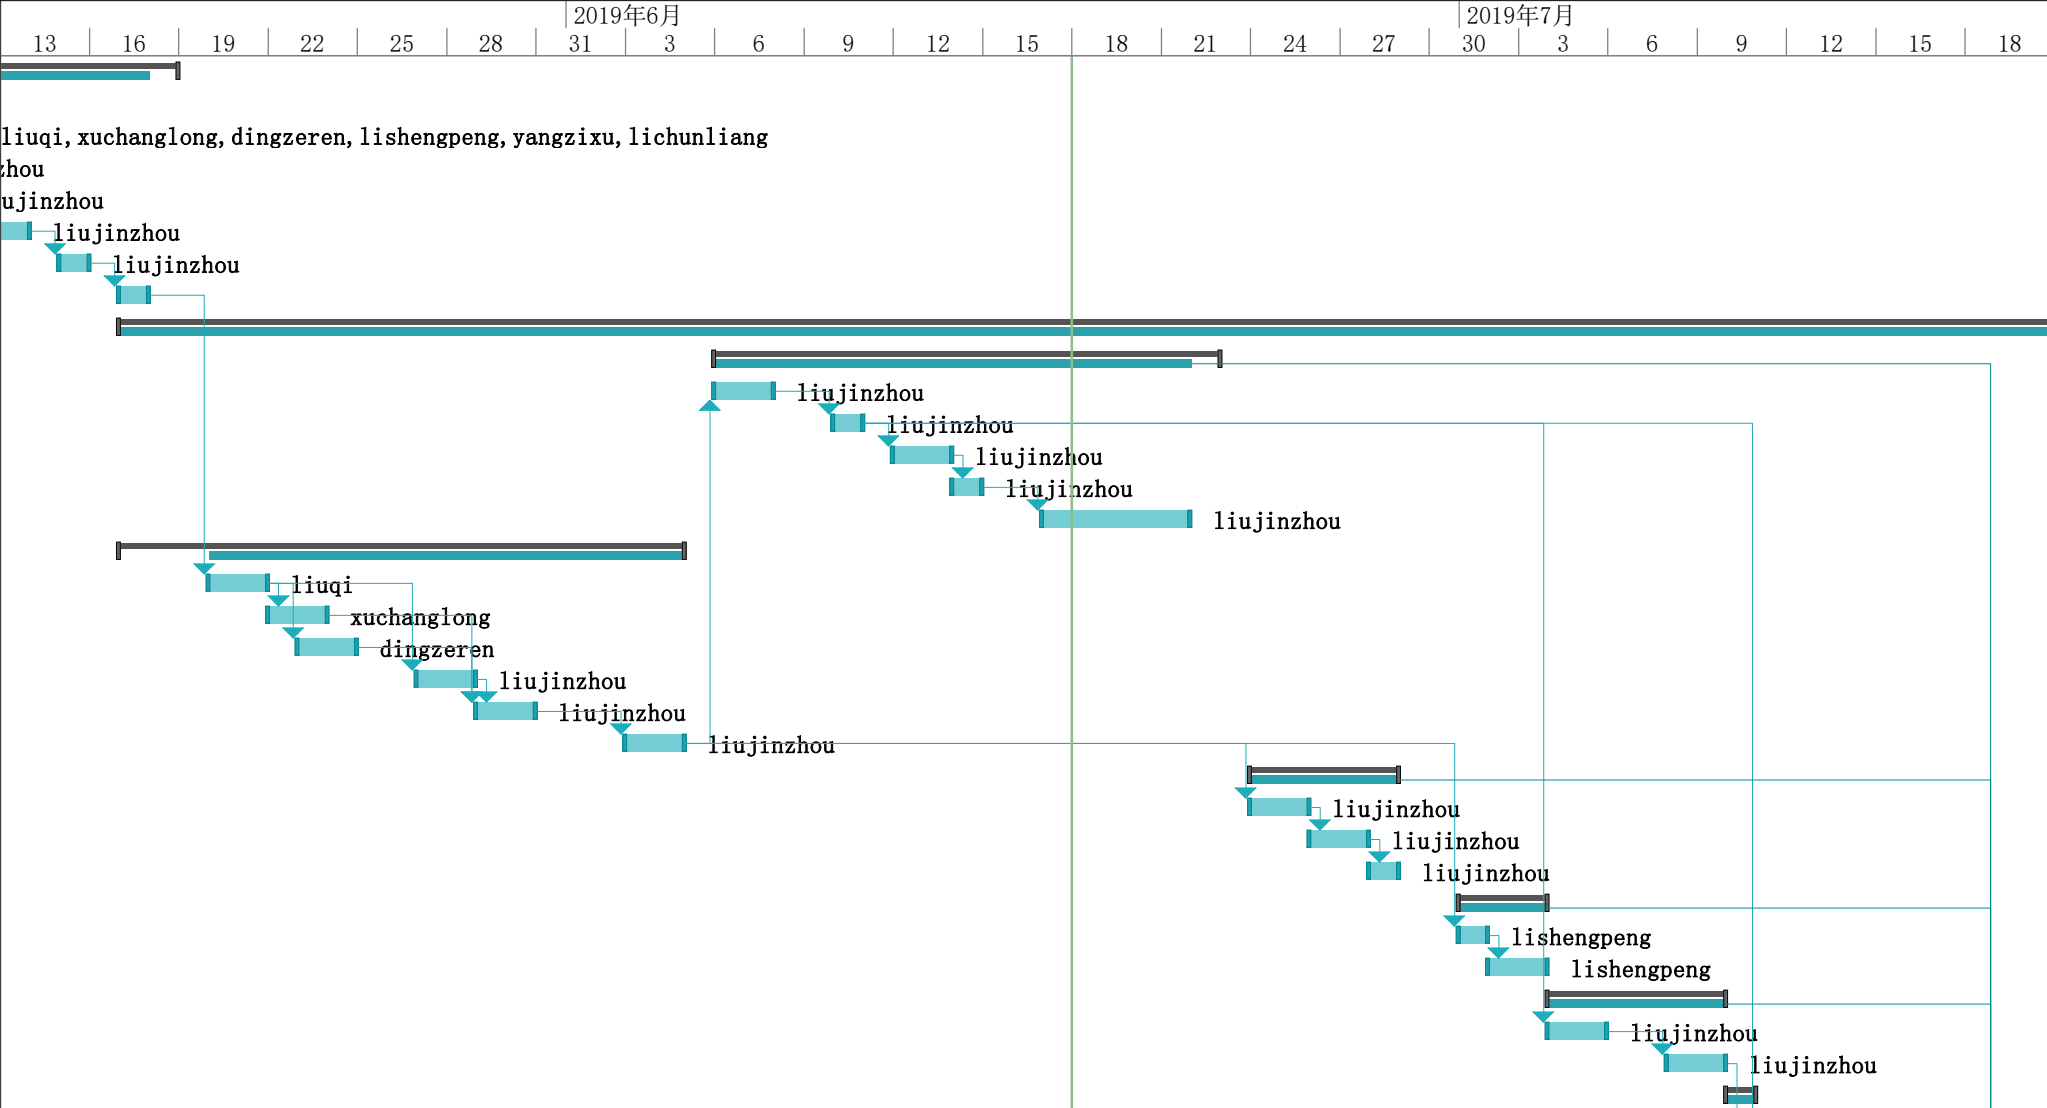











最后期限 


进度 


手动进度 




项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

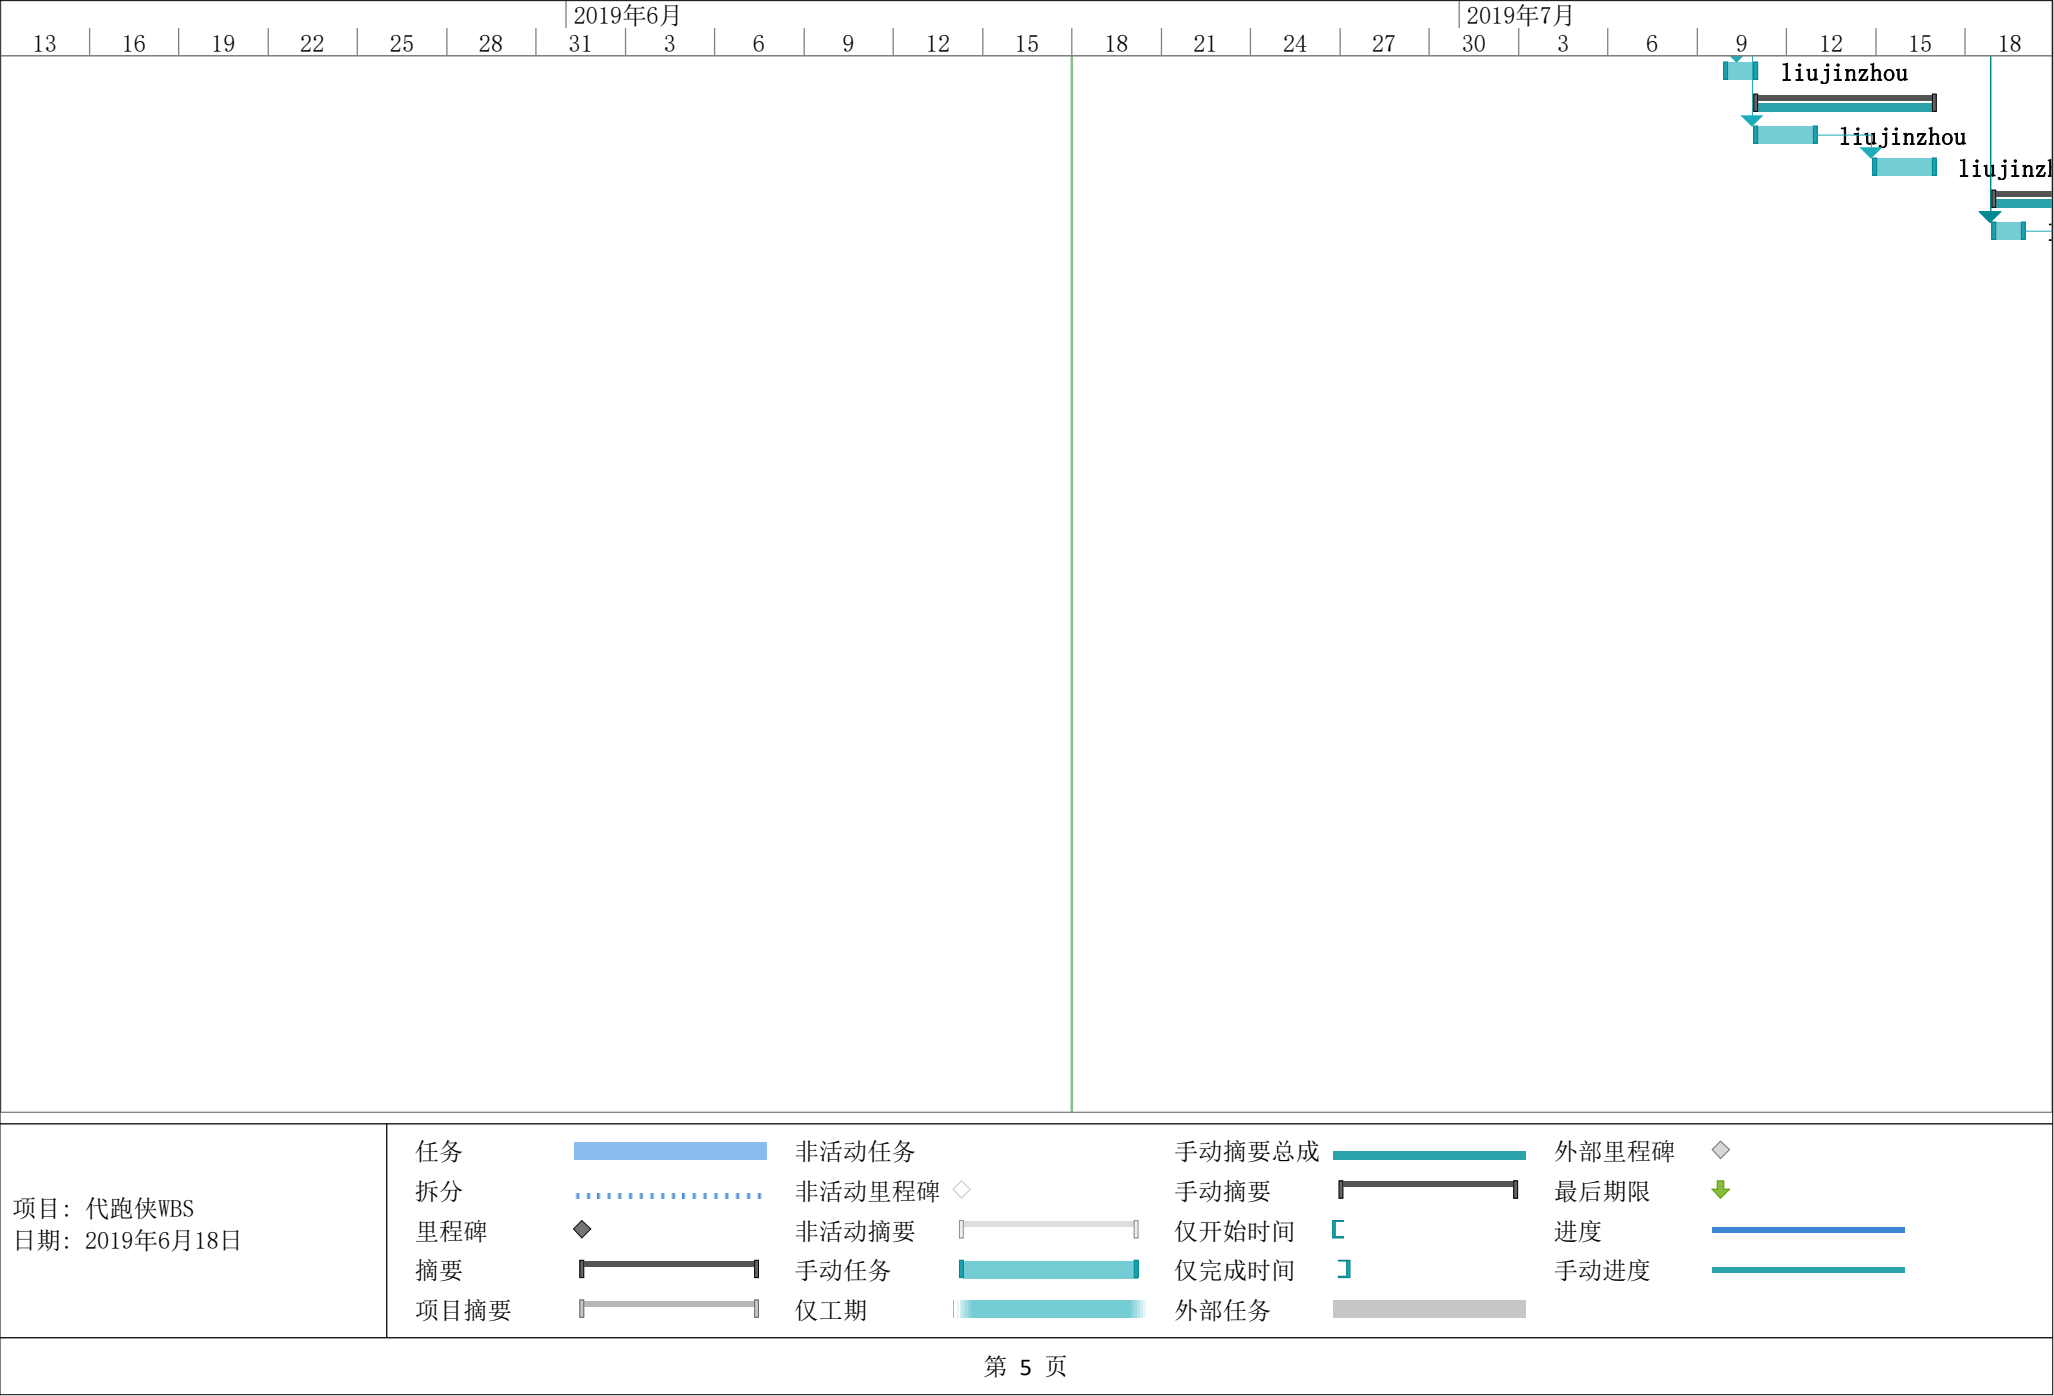

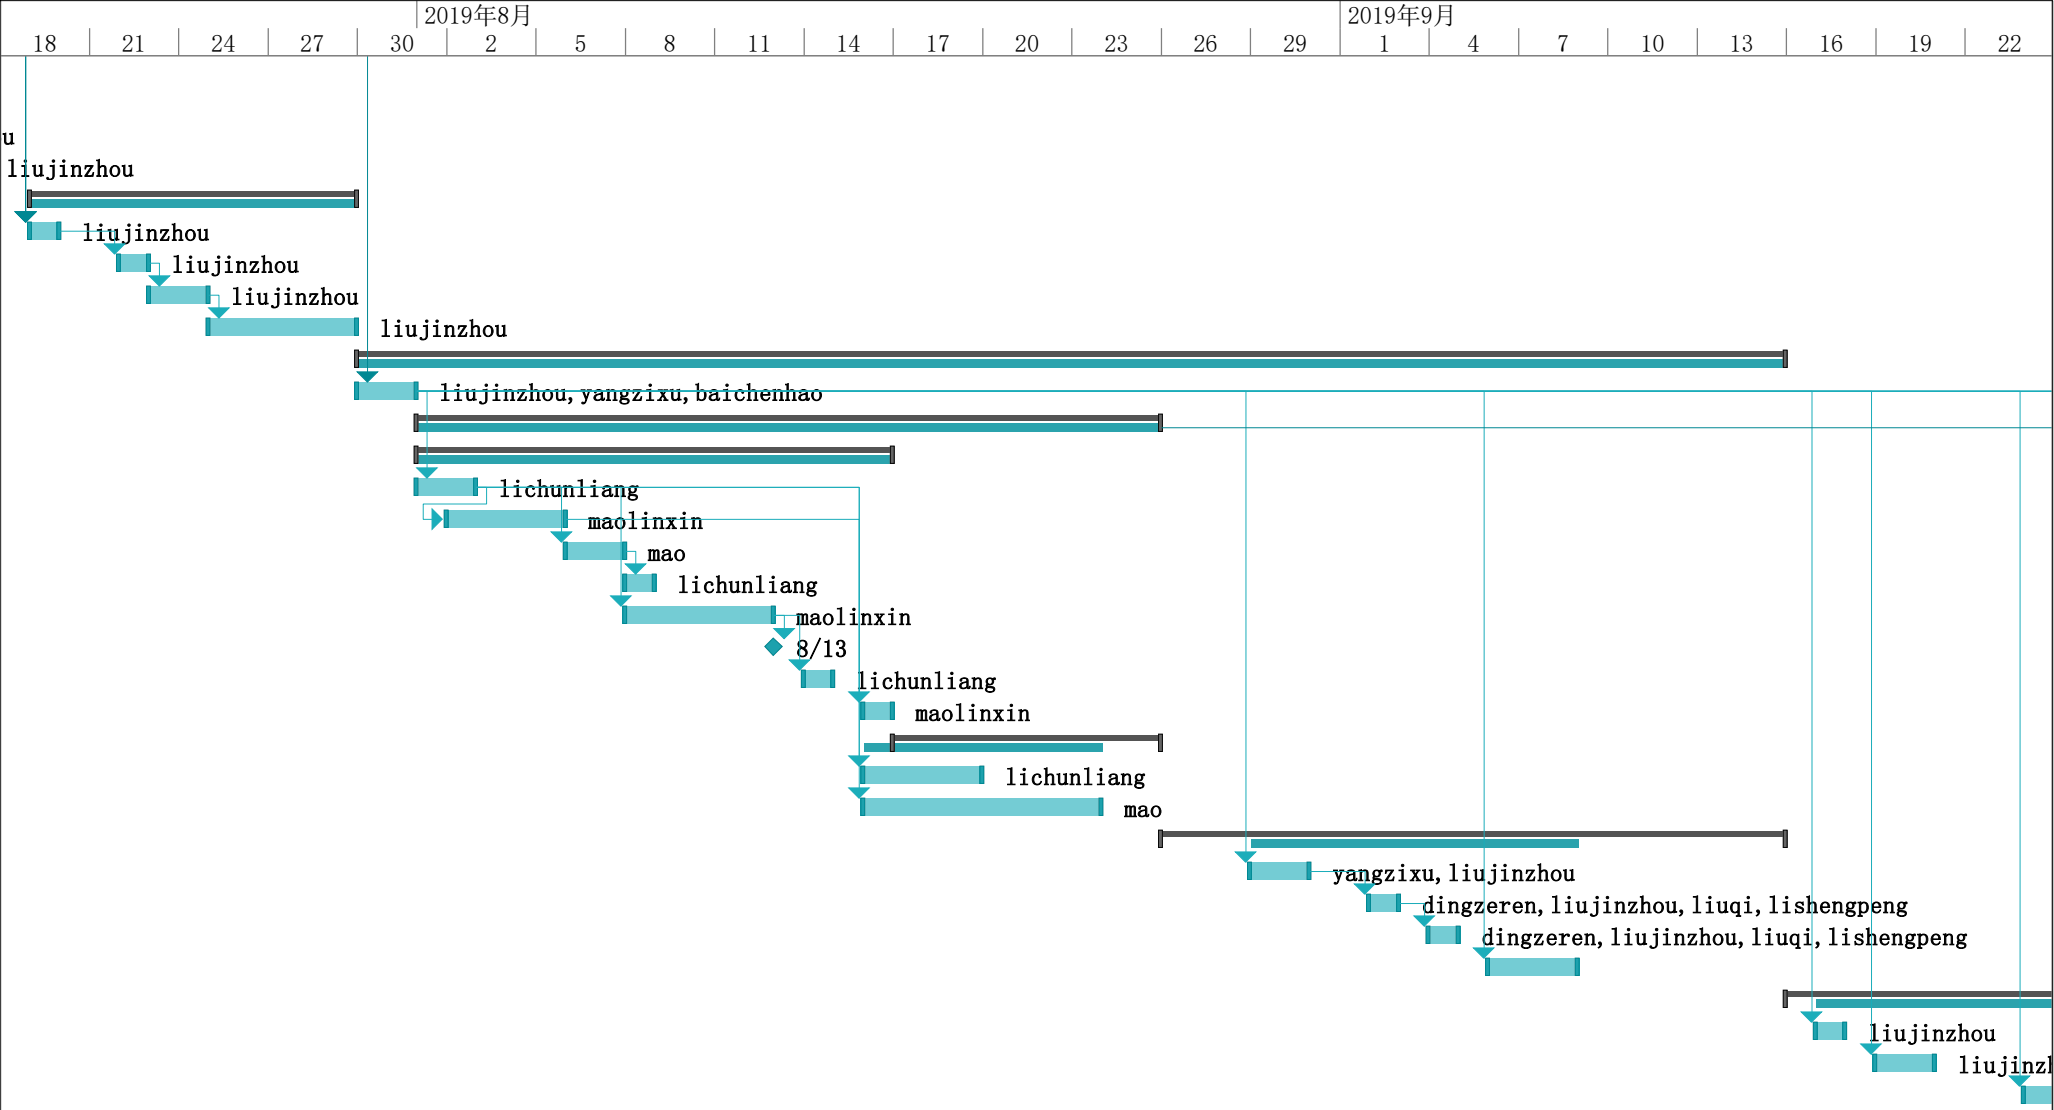


项目：代跑侠WBS 日期：2019年6月18日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			



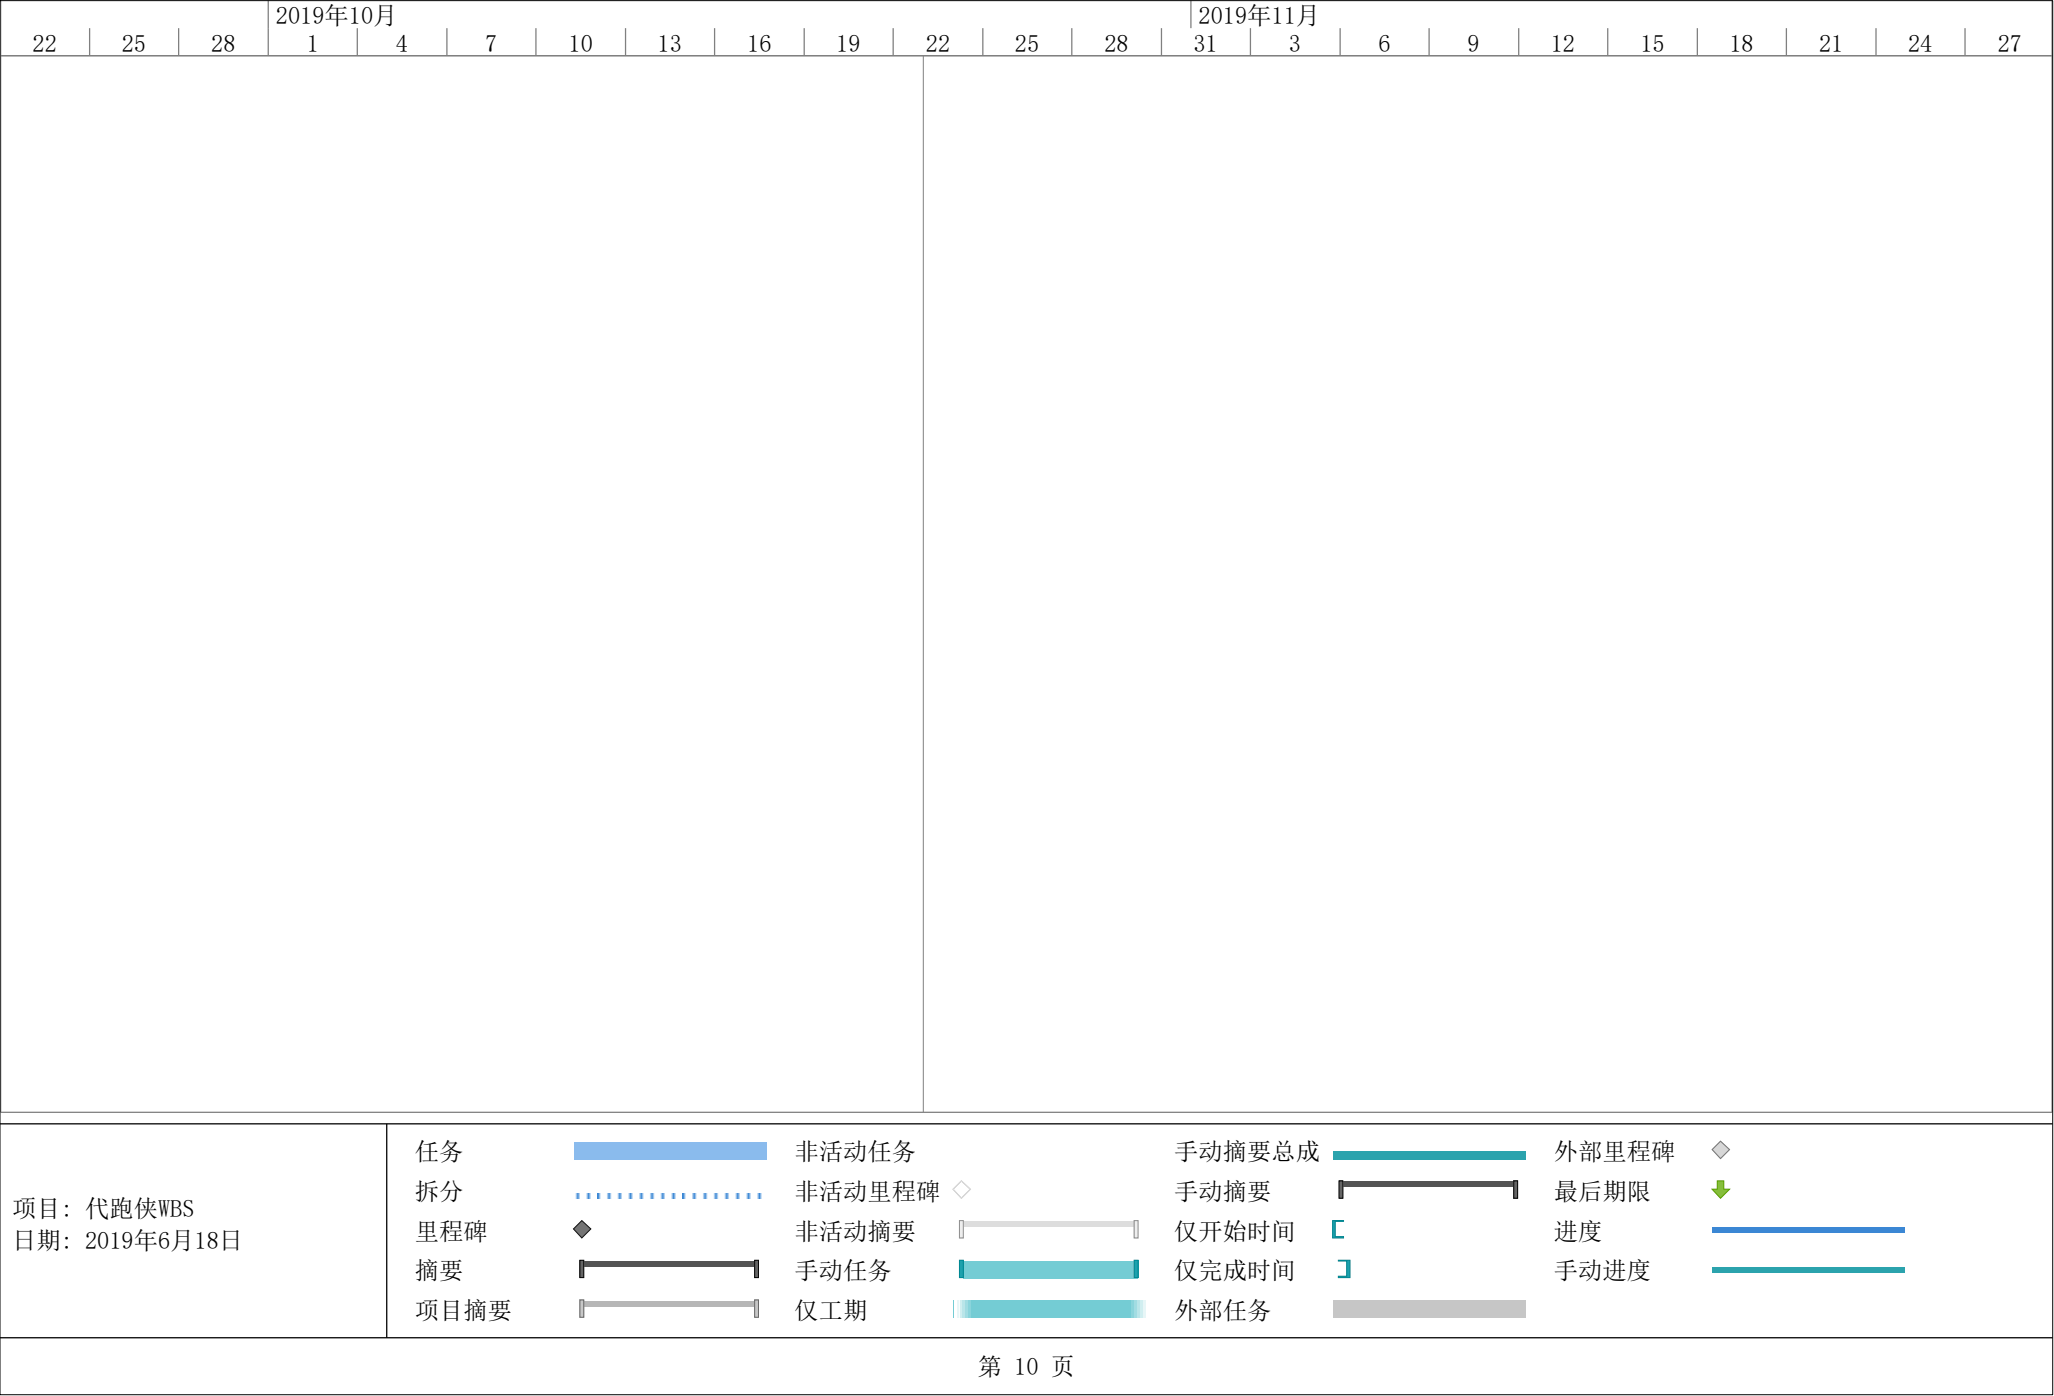

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

图例	说明
任务	蓝色条
非活动任务	浅蓝色条
手动摘要总成	深蓝色条
外部里程碑	灰色菱形
拆分	虚线
非活动里程碑	浅蓝色菱形
手动摘要	深蓝色条
最后期限	绿色向下箭头
里程碑	黑色菱形
非活动摘要	浅蓝色条
仅开始时间	浅蓝色条
进度	蓝色条
摘要	深蓝色条
手动任务	深蓝色条
仅完成时间	浅蓝色条
手动进度	深蓝色条
项目摘要	浅蓝色条
仅工期	浅蓝色条
外部任务	灰色条

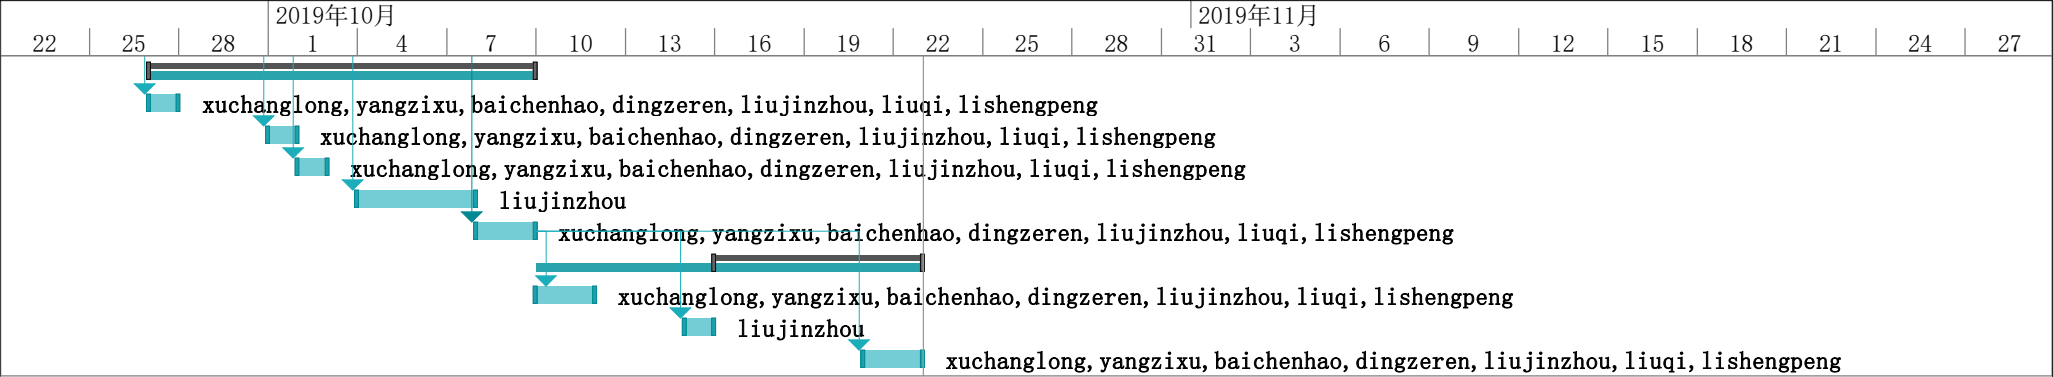

项目：代跑侠WBS
日期：2019年6月18日

任务		非活动任务		非活动里程碑		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限			
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度			
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度			
项目摘要		仅工期		外部任务					

